

桑名駅西地区

## 区画整理ニュース 第97号

【発行】  
桑名駅西  
整備事務所

## ■ 事業計画の変更について

令和3年5月18日に開催されました市議会全員協議会において、事業計画の変更(予定)について説明させていただきました。内容は下記のとおりです。

現在、県と協議中ですので、協議が整いましたら説明会を開催し、皆様にご説明させていただく予定でありますので、ご理解賜りますようお願いいたします。

## ① 事業期間の延伸

現在：平成13年9月10日から令和7年3月31日まで

変更：平成13年9月10日から令和17年3月31日まで <10年延伸>

## ② 事業費の変更

現在：284.5億円

変更：336.3億円 <51.8億円増>

## ■ 駅西広場の整備について

上記の事業計画の変更(予定)と同時に、桑名駅西口の駅西広場の本設整備予定についても説明させていただきました。

広場整備については、令和6年4月の供用開始を目指して進めていきたいと考えています。

<予備設計(点線枠)：基本案>



※ 予備設計(基本案)であり、今後の実施設計の中で修正が生じることがあります。  
また、隣接する公園整備の内容については未定です。


<< 裏面もご覧ください >>



## ■ 工事の実施について

令和3年度の主な工事は、昨年度に引き続き、蛸塚益生線、西口駅前線、各区画道路（下図実線）及び宅地の整備を行っています。

区域内の皆様には、たいへんご迷惑をおかけしておりますが、引き続き、ご理解ご協力のほどよろしくお願いいたします。

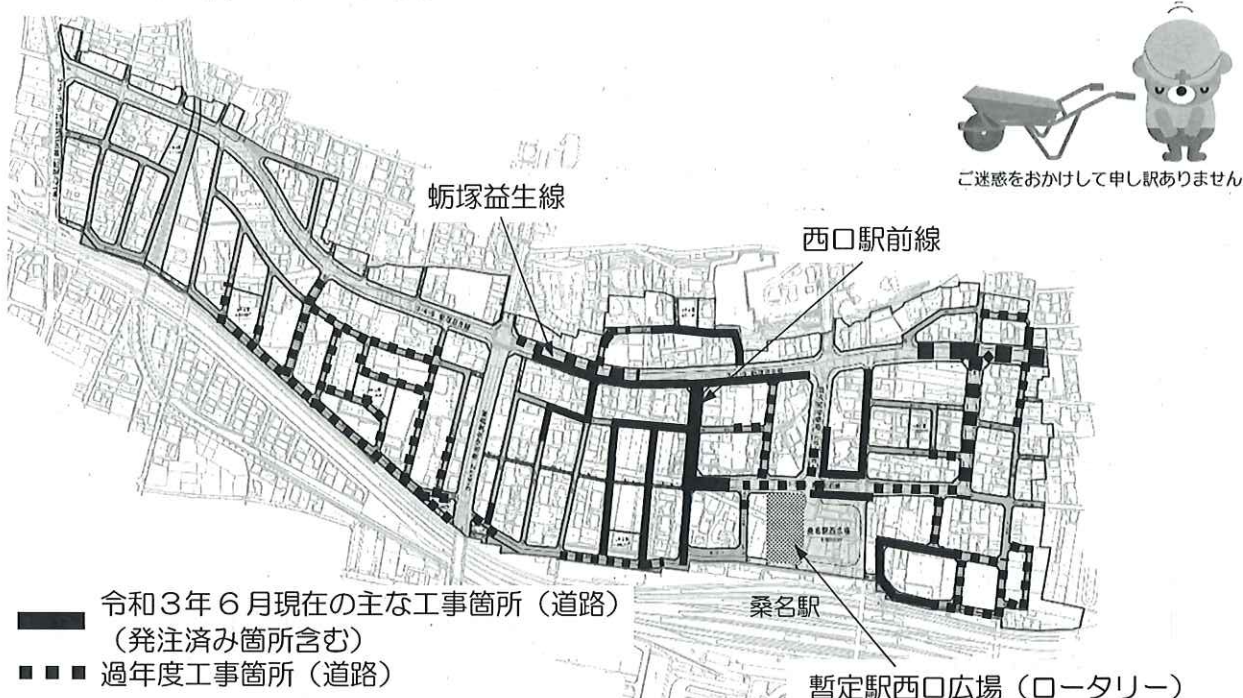

## ■ 全体事業計画に対する年度ごとの累積進捗率について

単位：%

|                    | 平成30年度末 | 令和元年度末 | 令和2年度末 |
|--------------------|---------|--------|--------|
| 仮換地先使用率<br>（面積ベース） | 16.0    | 19.8   | 26.8   |
| 移転補償率<br>（戸数ベース）   | 50.1    | 55.8   | 63.0   |
| 道路延長整備率<br>（延長ベース） | 22.3    | 24.4   | 28.2   |

事業に関するお問い合わせ等がございましたら、お気軽に下記までご連絡ください。

〒511-0811

三重県桑名市大字東方 288 番地 1

桑名駅西整備事務所

補償係  
管理係  
計画・工務係

TEL：0594-24-1439

TEL：0594-41-4401

TEL：0594-24-1368

FAX：0594-24-6338

E-mail: kukakuseirim@city.kuwana.lg.jp
