
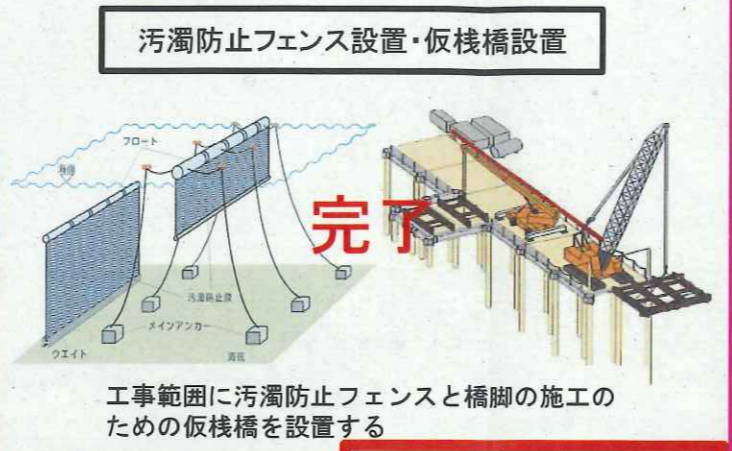


# 工事の進捗状況

令和2年度  
1号伊勢大橋長良川右岸下部工事  
株式会社大林組

## 工事内容

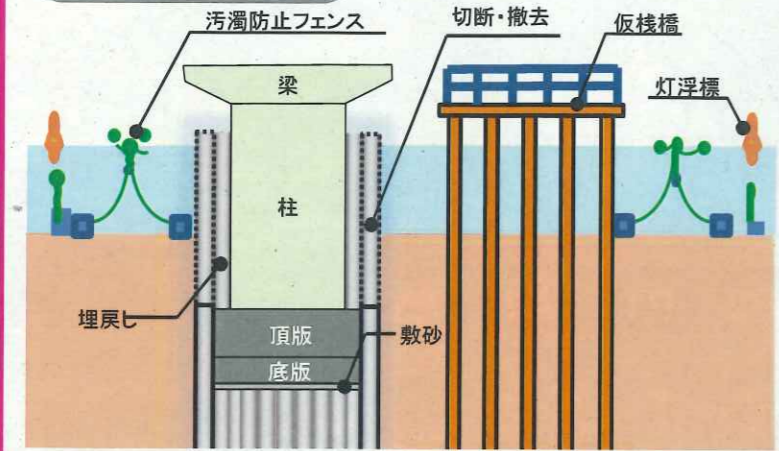

汚濁防止フェンス設置・仮栈橋設置


工事範囲に汚濁防止フェンスと橋脚の施工のための仮栈橋を設置する

### ①鋼管矢板打設



鋼管矢板(φ1,000mm、L=52.5~53.5m)を円筒状にパイロハンマおよび油圧ハンマで打設する

### ②井筒内掘削

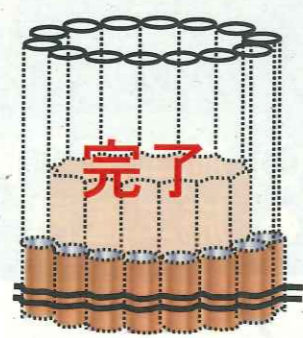


鋼管井筒内の土砂を所定の深さまで掘削する

### ③底版コンクリート打設




鋼管井筒内掘削床へ敷砂し、水中不分離コンクリートを打設する

### ④頂版コンクリート打設

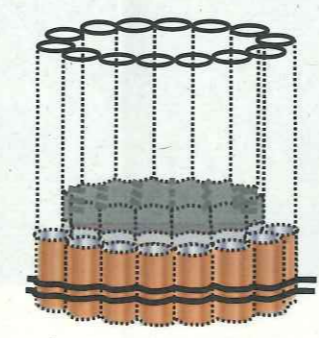


鉄筋を組立て、頂版コンクリートを打設する

### ⑤柱コンクリート打設

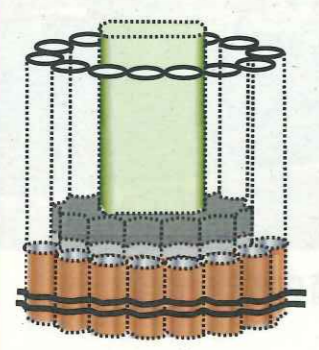


鉄筋を組立て、柱コンクリートを打設する

### ⑥埋戻し・鋼管矢板切断

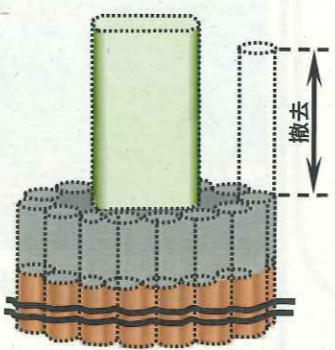


井筒内を埋め戻し、所定の高さで鋼管杭を切断、撤去する

### ⑦梁コンクリート打設

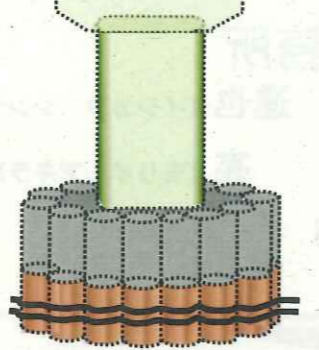

鉄筋を組立て、梁コンクリートを打設する

### 汚濁防止フェンス撤去・仮栈橋撤去

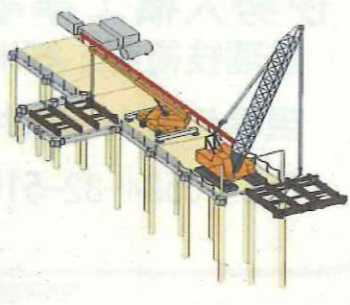

工事範囲の汚濁防止膜と仮栈橋を撤去する

## 全体工程表

作業項目	令和2年度					令和3年度					令和4年度							
	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	
不発弾磁気探査・ボーリング工	■																	
汚濁防止フェンス・仮栈橋設置工																		
鋼管矢板基礎工(左図:①②③)																		
橋脚躯体工(左図:④⑤⑥⑦)																		
汚濁防止フェンス・仮栈橋撤去工																		
片付け工																		

※工期内の2回の非出水期(10月~5月)に工事を実施いたします。

## 今月の作業

P5橋脚において、2月下旬に底版コンクリート打設作業が完了し、頂版コンクリート打設作業を進めています。その後、いよいよ橋脚躯体部の柱コンクリートを打設します。作業は、すべて仮栈橋上から行います。河川内の航路等に変更はありません。



橋脚本体を支える部分である頂版のコンクリートを打設します。その後、柱コンクリート打設へ進みます。コンクリート打設作業は、仮栈橋上からコンクリートポンプ車により打設を行います。

## 工事位置図



令和2年度  
1号桑名東部地区改良工事  
(株)ナガシマ

令和2年度  
1号伊勢大橋長良川右岸下部工事  
(株)大林組

令和2年度  
1号桑名東部地区改良工事  
(株)ナガシマ

冬の名残のまだ去りやらぬ時候、地域の皆様方におかれましては、ますますご健勝のこととお喜び申し上げます。日頃より伊勢大橋関連事業において、ご理解とご協力を賜り、誠にありがとうございます。

現在、当事業につきましては「1号桑名東部地区改良工事 (株)ナガシマ」において、長島地区の切回し道路整備工事、桑名地区の側道整備工事を進めております。また、「令和2年度 1号伊勢大橋長良川右岸下部工事 (株)大林組」において、河川内にて橋脚構築の工事を進めております。

地域の皆様方にはご迷惑をお掛けする事がないよう、第三者災害に繋がる交通災害の防止に努め、安全第一で工事を進めてまいりますので、皆様のご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

～伊勢大橋関連工事関係者～

## 令和2年度 1号桑名東部地区改良工事 株式会社 ナガシマ


### 地域住民の皆様へ

日頃より伊勢大橋関連事業にご理解・ご協力を頂き、有難うございます。2月は、法面ブロック工、排水構造物工、舗装工を進めてまいりました。3月は、引き続き、舗装工、防護柵工、区画線工へと施工を進めます。工事期間中は、安全を第一に作業を進めてまいります。何卒よろしくお願い申し上げます。



### 株式会社 ナガシマ 長島作業所

工事名: 令和2年度 1号線桑名東部地区改良工事  
工期: 令和2年7月18日 ~ 令和3年3月26日  
担当者: 現場代理人 上田 勝明 監理技術者 安井 健二  
連絡先: TEL 0594-42-3633 FAX 0594-42-3701



## 令和2年度 1号伊勢大橋長良川右岸下部工事 株式会社 大林組

### 地域住民の皆様へ

日頃より伊勢大橋関連事業にご理解・ご協力を頂き、有難うございます。P5橋脚では、底版コンクリート打設作業が完了し、頂版コンクリート打設作業を進めていきます。大型ミキサー車によりコンクリートの運搬を行います。ミキサー車の運行についてはこれまでと同様に、安全運転、思いやり運転の励行で進めていきます。工事期間中は、安全を第一に作業を進めてまいります。何卒よろしくお願い申し上げます。

### 株式会社大林組 伊勢大橋工事事務所

工事名: 令和2年度 1号伊勢大橋長良川右岸下部工事  
工期: 令和2年9月9日 ~ 令和4年9月30日  
担当者: 現場代理人 森井 亮 監理技術者 石川 進也  
連絡先: 住所 桑名市東方753-2 桑名市東方ビル2階  
TEL 0594-82-5106 FAX 0594-82-5107

